# 月 間 工 程 表

| 工事件名 | 工 期 | |
|---|---|---|
| 境川金森調節池工事その2 | 2018年10月9日～2024年11月14日 | 青：予定 |

2021年6月
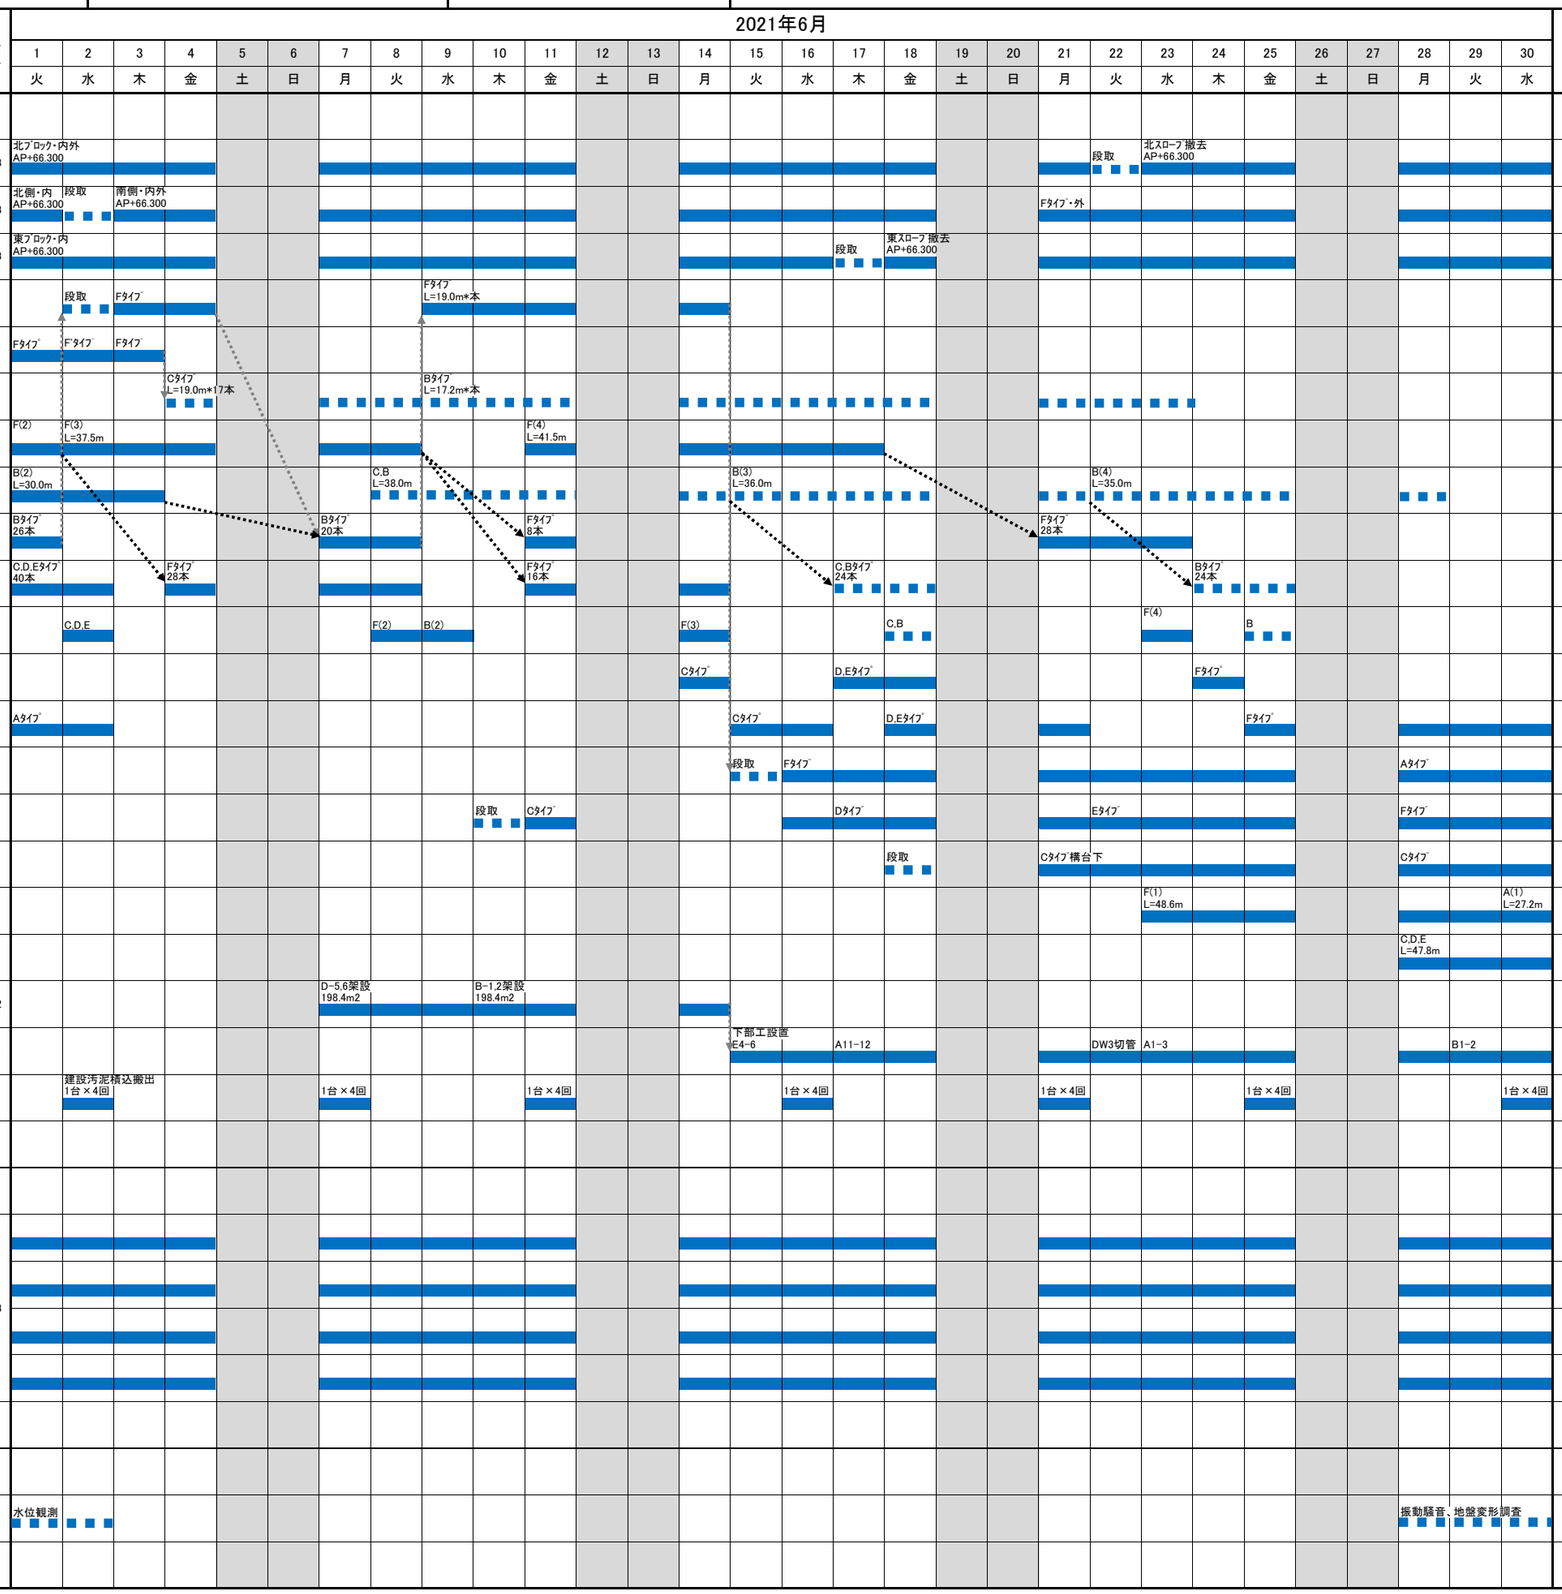
| 工種 | | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 主要工程表 | | | | |
| 【調節池ヤード】 | | | | |
| 掘削工 | 3段掘削（北ﾌﾞﾛｯｸ） | 30,465 | m3 | |
| －〃－ | －〃－（西ﾌﾞﾛｯｸ） | 〃 | m3 | |
| －〃－ | －〃－（東ﾌﾞﾛｯｸ） | 〃 | m3 | |
| 土留工 | 2段目：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 | 309 | 本 | |
| －〃－ | －〃－：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 | 〃 | 本 | |
| －〃－ | －〃－：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 | 〃 | 本 | |
| －〃－ | －〃－：腹起設置① | 466 | m | |
| －〃－ | －〃－：腹起設置② | 〃 | m | |
| －〃－ | －〃－：緊張定着 | 309 | 個 | |
| －〃－ | －〃－：緊張定着 | 〃 | 個 | |
| －〃－ | －〃－：点検通路 | 1 | 式 | |
| －〃－ | 3段目：鉄板敷設・布掘り | 1 | 式 | |
| －〃－ | 3段目：ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接 | 618 | 本 | |
| －〃－ | 3段目：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 | 309 | 本 | |
| －〃－ | －〃－：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 | 〃 | 本 | |
| －〃－ | －〃－：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 | 〃 | 本 | |
| －〃－ | －〃－：腹起設置① | 466 | m | |
| －〃－ | －〃－：腹起設置② | 〃 | m | |
| 仮桟橋工 | 構台架設 | 1130 | m2 | |
| －〃－ | 下部工：1段目 | 1 | 式 | |
| －〃－ | 産廃積込搬出（建設汚泥） | 1 | 式 | |
| 【土砂搬出ヤード】 | | | | |
| 運搬工 | 土砂積込運搬 八王子地区（2） | 274,042 | m3 | |
| －〃－ | －〃－ 八王子地区（5） | | | |
| －〃－ | －〃－ 青梅地区（キ） | | | |
| －〃－ | －〃－ 仮置場（巴山） | | | |
| 【その他】 | | | | |
| 環境調査 | 水位観測 騒音振動調査 | 1 | 式 | |
