月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定
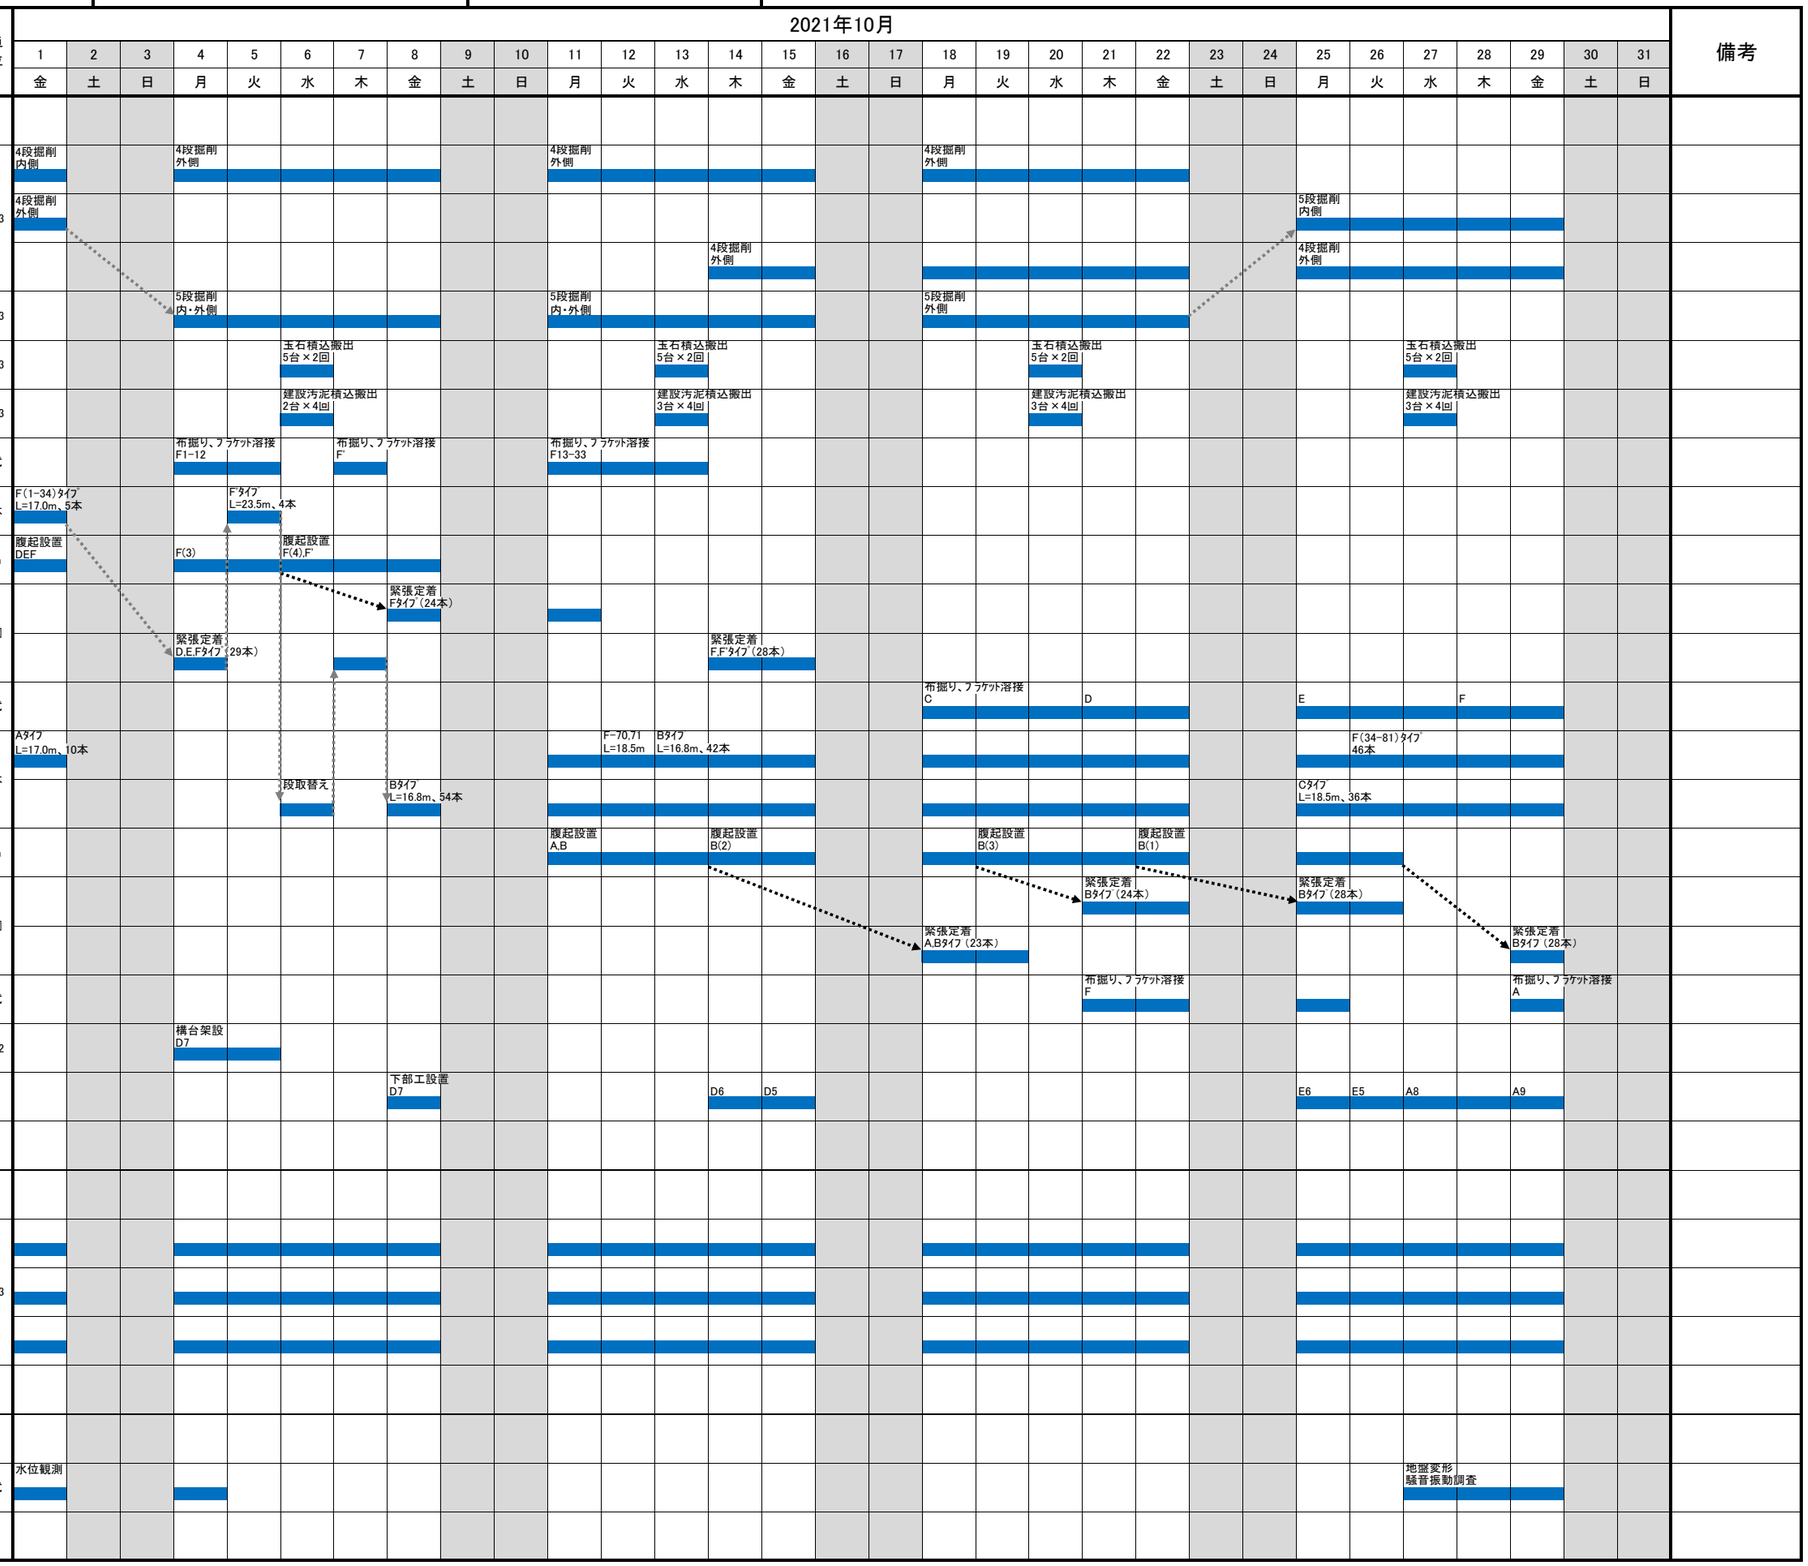
	工種		数量	単位	備考
主要工程表	【調節池ヤード】				
	掘削工	4段掘削（掘削班①）	27,082	m3	
	－〃－	－〃－（掘削班②）			
	－〃－	－〃－（掘削班③）			
	－〃－	5段掘削（掘削班②）	27,082	m3	
	－〃－	玉石積込搬出（UCRへ）	8664	m3	
	－〃－	産廃積込搬出（建設汚泥）	3218.6	m3	
	土留工	3段目：布掘り・ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	1	式	
	－〃－	3段目：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設	309	本	
	－〃－	－〃－：腹起設置	466	m	
	－〃－	－〃－：緊張定着	309	個	
	－〃－	－〃－：緊張定着			
	－〃－	4段目：布掘り・ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	1	式	
	－〃－	－〃－：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設	309	本	
	－〃－	－〃－：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設			
	－〃－	－〃－：腹起設置	466	m	
	－〃－	－〃－：緊張定着	309	個	
	－〃－	－〃－：緊張定着			
	－〃－	5段目：布掘り・ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	1	式	
	仮桟橋工	構台架設	1130	m2	
	－〃－	下部工：1段目	183.1	t	
	【土砂搬出ヤード】				
	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区（2）	274,042	m3	
	－〃－	－〃－ 八王子地区（5）			
	－〃－	－〃－ 青梅地区（キ）			
	【その他】				
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式
