月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定
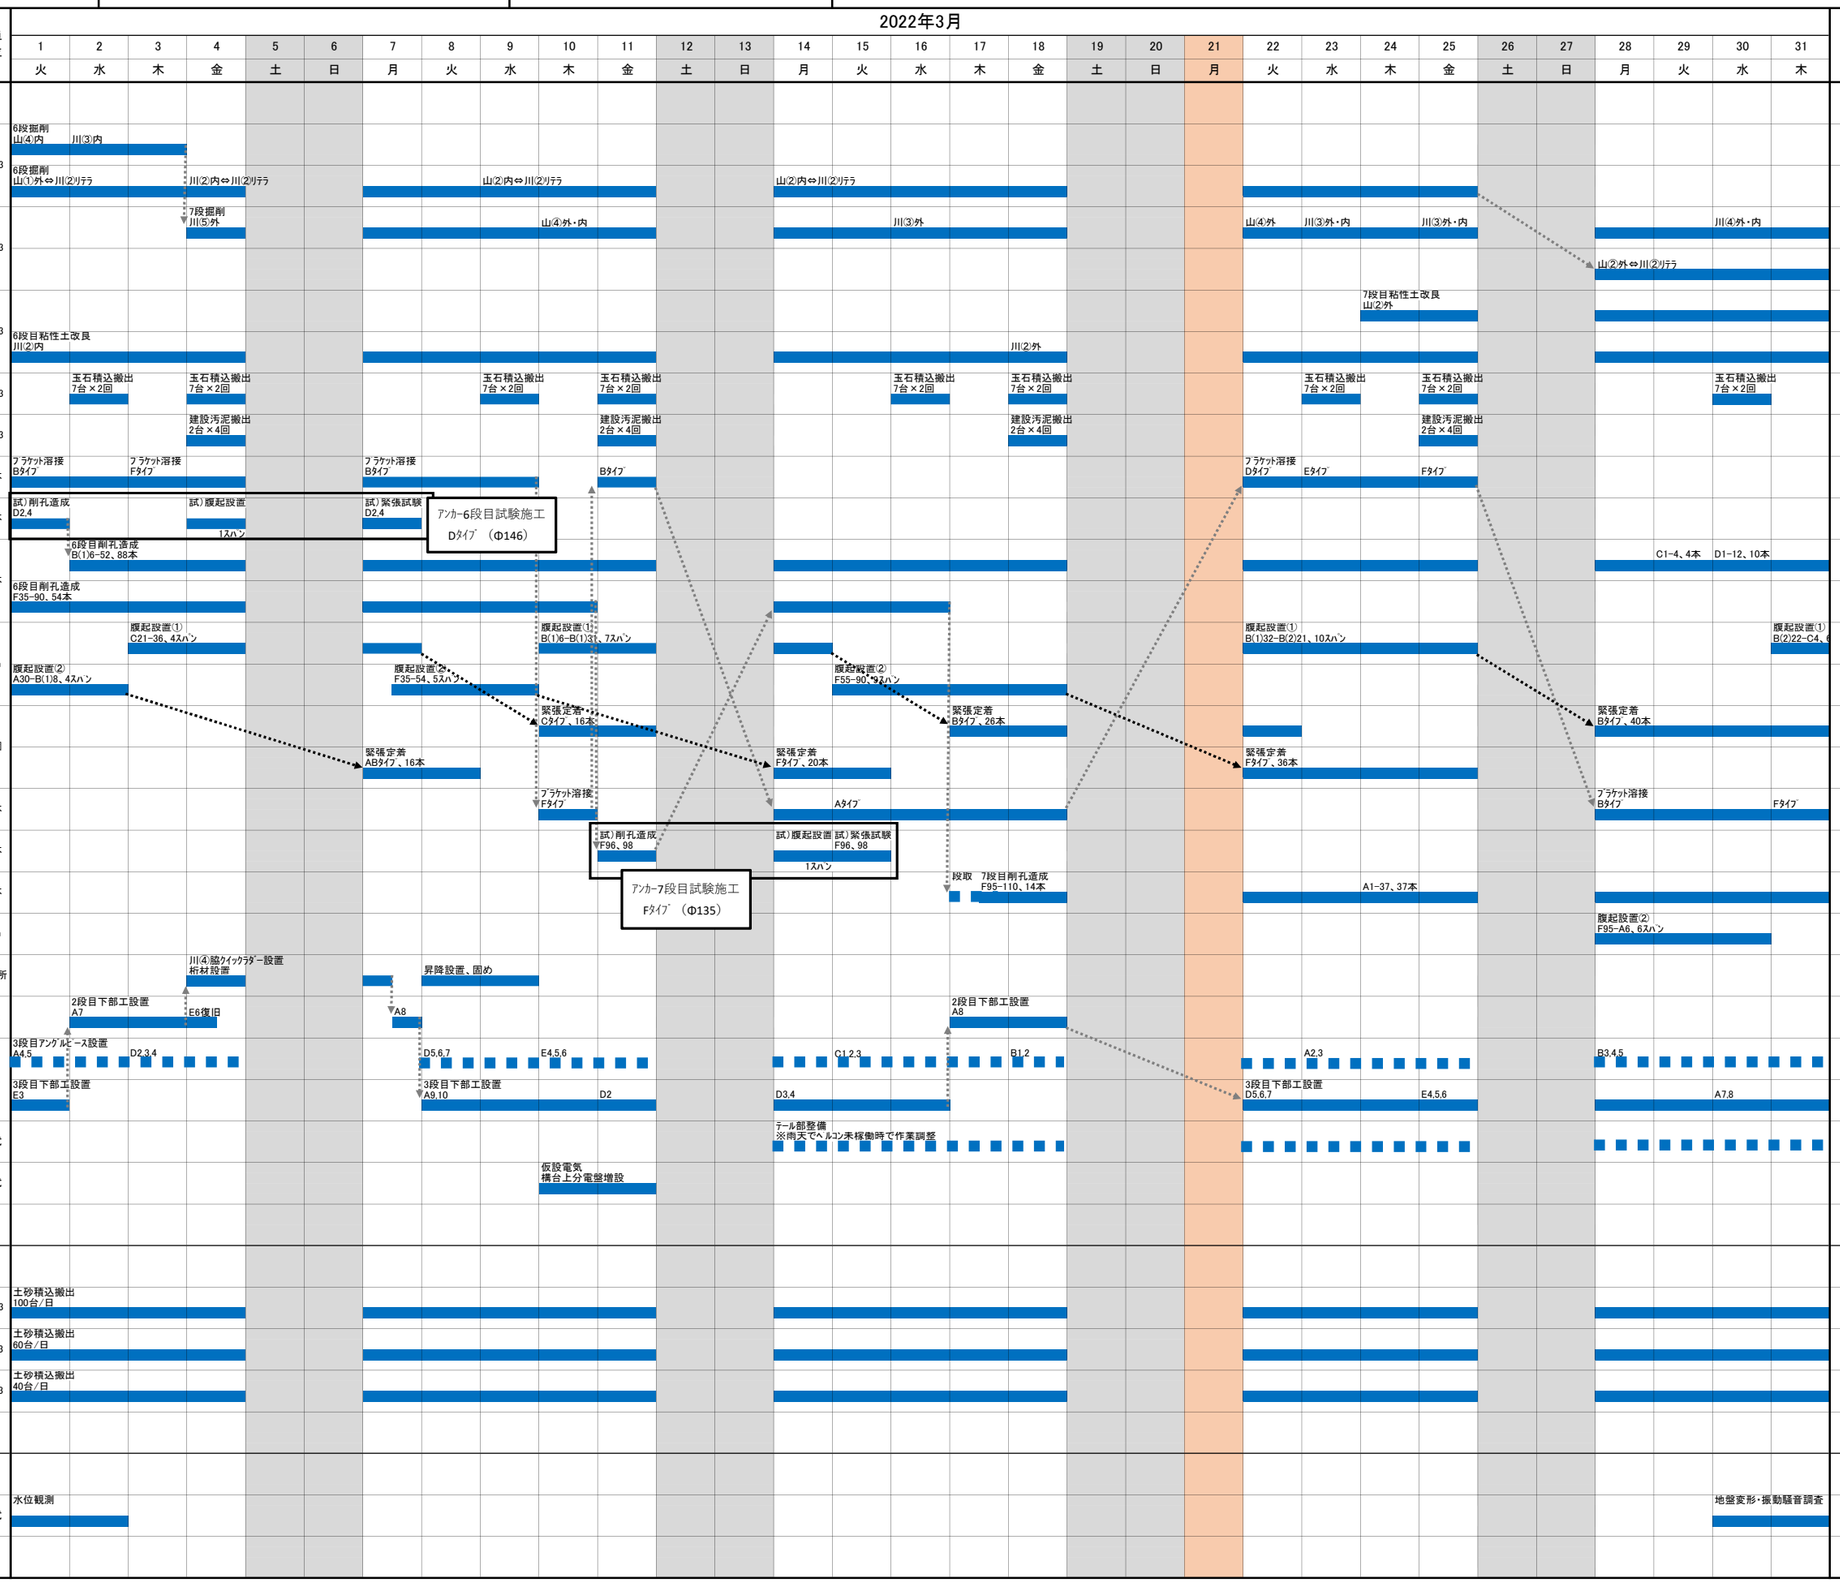
	工 種		数量	単位	備考
	【調節池ヤード】				
主要工程表	掘削工	6段掘削（掘削班①）	30,566	m3	
	－〃－	－〃－（掘削班②）			
	－〃－	7段掘削（掘削班①）	30,566	m3	
	－〃－	－〃－（掘削班②）			
	－〃－	6,7段目粘性土改良（①）	14,949	m3	
	－〃－	－〃－（②）			
	－〃－	玉石積込搬出（UCRへ）	8,664	m3	
	－〃－	産廃積込搬出（建設汚泥）	3,219	m3	
	土留工（6段目）	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	620	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ試験施工	2	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成（1号機）	310	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成（2号機）			
	－〃－	腹起設置（1号側）	466	m	
	－〃－	腹起設置（2号側）			
	－〃－	緊張定着（1号機）	310	個	
	－〃－	緊張定着（2号機）			
	土留工（7段目）	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	620	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ試験施工	2	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成（2号機）	310	本	
	－〃－	腹起設置（2号側）	466	m	
	仮桟橋工	昇降設備	6	箇所	
	－〃－	下部工：2段目設置	174.2	t	
	－〃－	下部工：3段目段取	171.0	t	
	－〃－	下部工：3段目設置			
	土砂搬出設備	月例点検	1	式	
	仮設工	仮設電気	1	式	
	【土砂搬出ヤード】				
	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区（2）	274,042	m3	
	－〃－	－〃－ 八王子地区（5）	〃	m3	
	－〃－	－〃－ 青梅地区（キ）	〃	m3	
	【その他】				
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式
