月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定

2023年1月
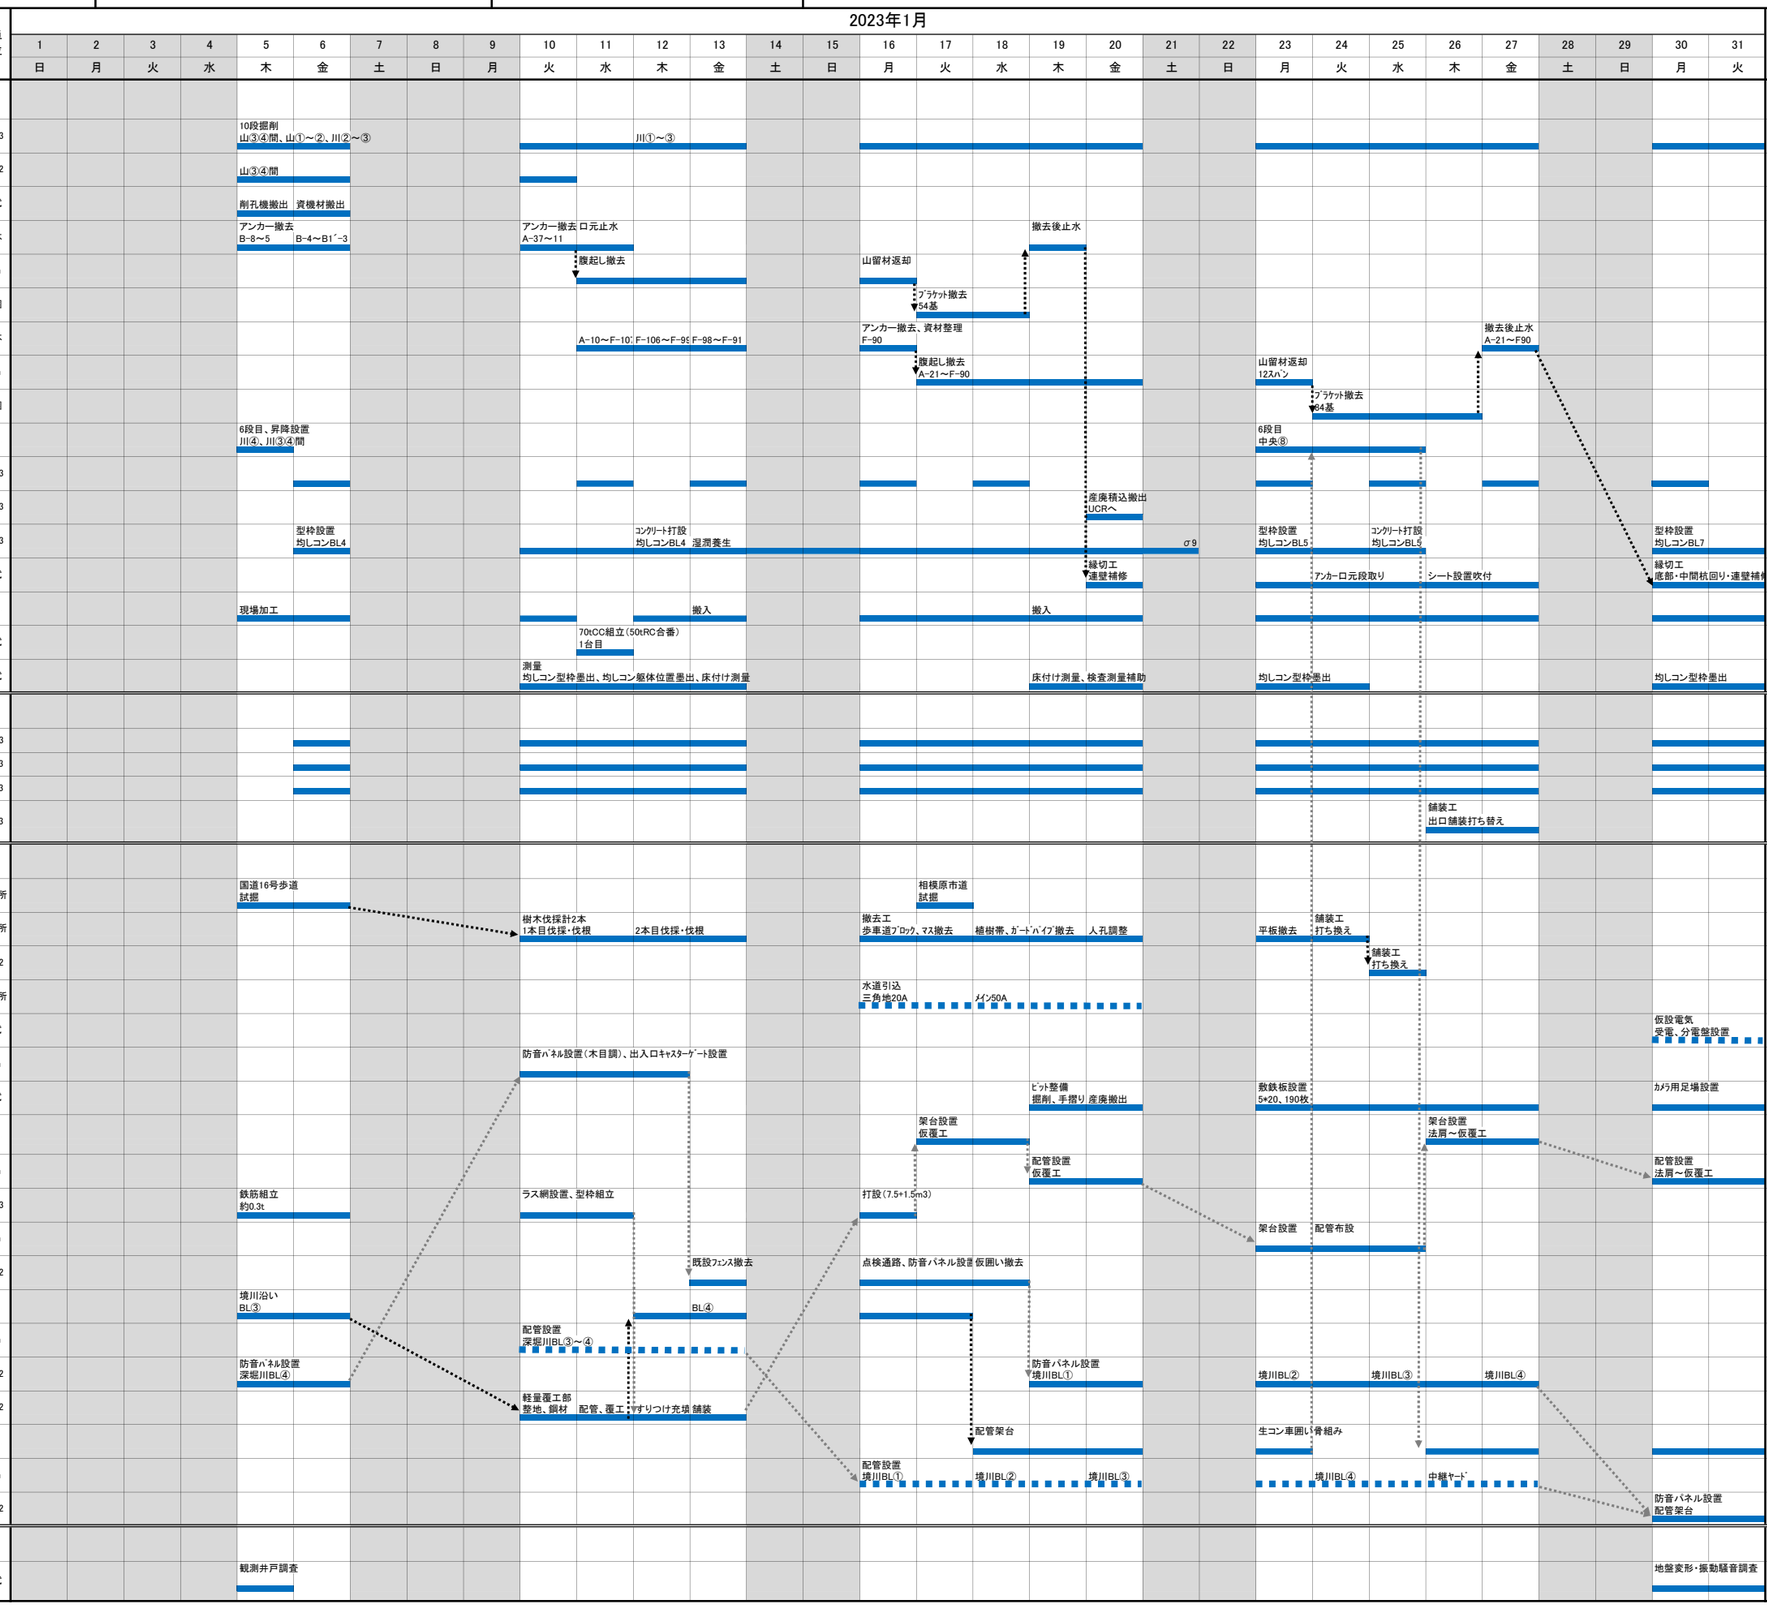
工種			数量	単位	備考
主要工程表	【調節池ヤード】				
	掘削工	10段掘削	35,350	m3	
	－〃－	基面整正	13,680	m2	
	土留工	搬出	1	式	
	－〃－	アンカー除去（北東）	36	本	
	－〃－	腹起し撤去（北東）	54	m	
	－〃－	ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去（北東）	54	個	
	土留工（9段目）	アンカー除去（北西）	33	本	
	－〃－	腹起し撤去（北西）	57	m	
	－〃－	ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去（北西）	84	個	
	仮桟橋工	下部工：6段目設置	12.0	t	
	掘削工	玉石積込搬出（UCRへ）	8,664	m3	
	－〃－	産廃積込搬出（建設汚泥）	3,219	m3	
	本体構築工	均しコンクリート	780	m3	
	－〃－	縁切工	1	式	
	－〃－	鉄筋工（底版）	2748	t	
	－〃－	揚重機械搬入組立	1	式	
	－〃－	測量、墨出	1	式	
	【土砂搬出ヤード】				
	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区（2）	274,042	m3	
	－〃－	－〃－ 八王子地区（5）	〃	m3	
	－〃－	－〃－ 青梅地区（キ）	〃	m3	
	舗装工	搬出ヤード出口舗装補修	〃	m3	
	【長距離圧送整備】				
	圧送ヤード 圧送設備整備工	試掘	2	箇所	
	圧送ヤード －〃－	国道16号切り下げ	2	箇所	
	圧送ヤード －〃－	市道舗装打ち換え	90	m2	
	圧送ヤード －〃－	給水接続（20mm,50mm）	2	箇所	
	圧送ヤード －〃－	仮設電気受電	1	式	
	圧送ヤード －〃－	仮囲い設置	100	m	
	圧送ヤード －〃－	場内整備	1	式	
	圧送ヤード －〃－	配管架台設置	0.7	t	
	圧送ヤード －〃－	配管布設	120	m	
	法面部 圧送設備整備工	配管部基礎コン	7.5	m3	
	法面部 －〃－	配管架台、配管	120	m	
	法面部 －〃－	防音パネル設置	80	m2	
	河川沿い 圧送設備整備工	配管架台	47	t	
	河川沿い －〃－	配管工	1,590	m	
	河川沿い －〃－	防音パネル	1,080	m2	
	河川沿い －〃－	軽量覆工設置	4	m2	
	中継ヤード 圧送設備整備工	配管・生コン車囲い架台	10	t	
	中継ヤード －〃－	配管工	180	m	
	中継ヤード －〃－	防音パネル	370	m2	
	【その他】				
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式
