月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定

2023年10月
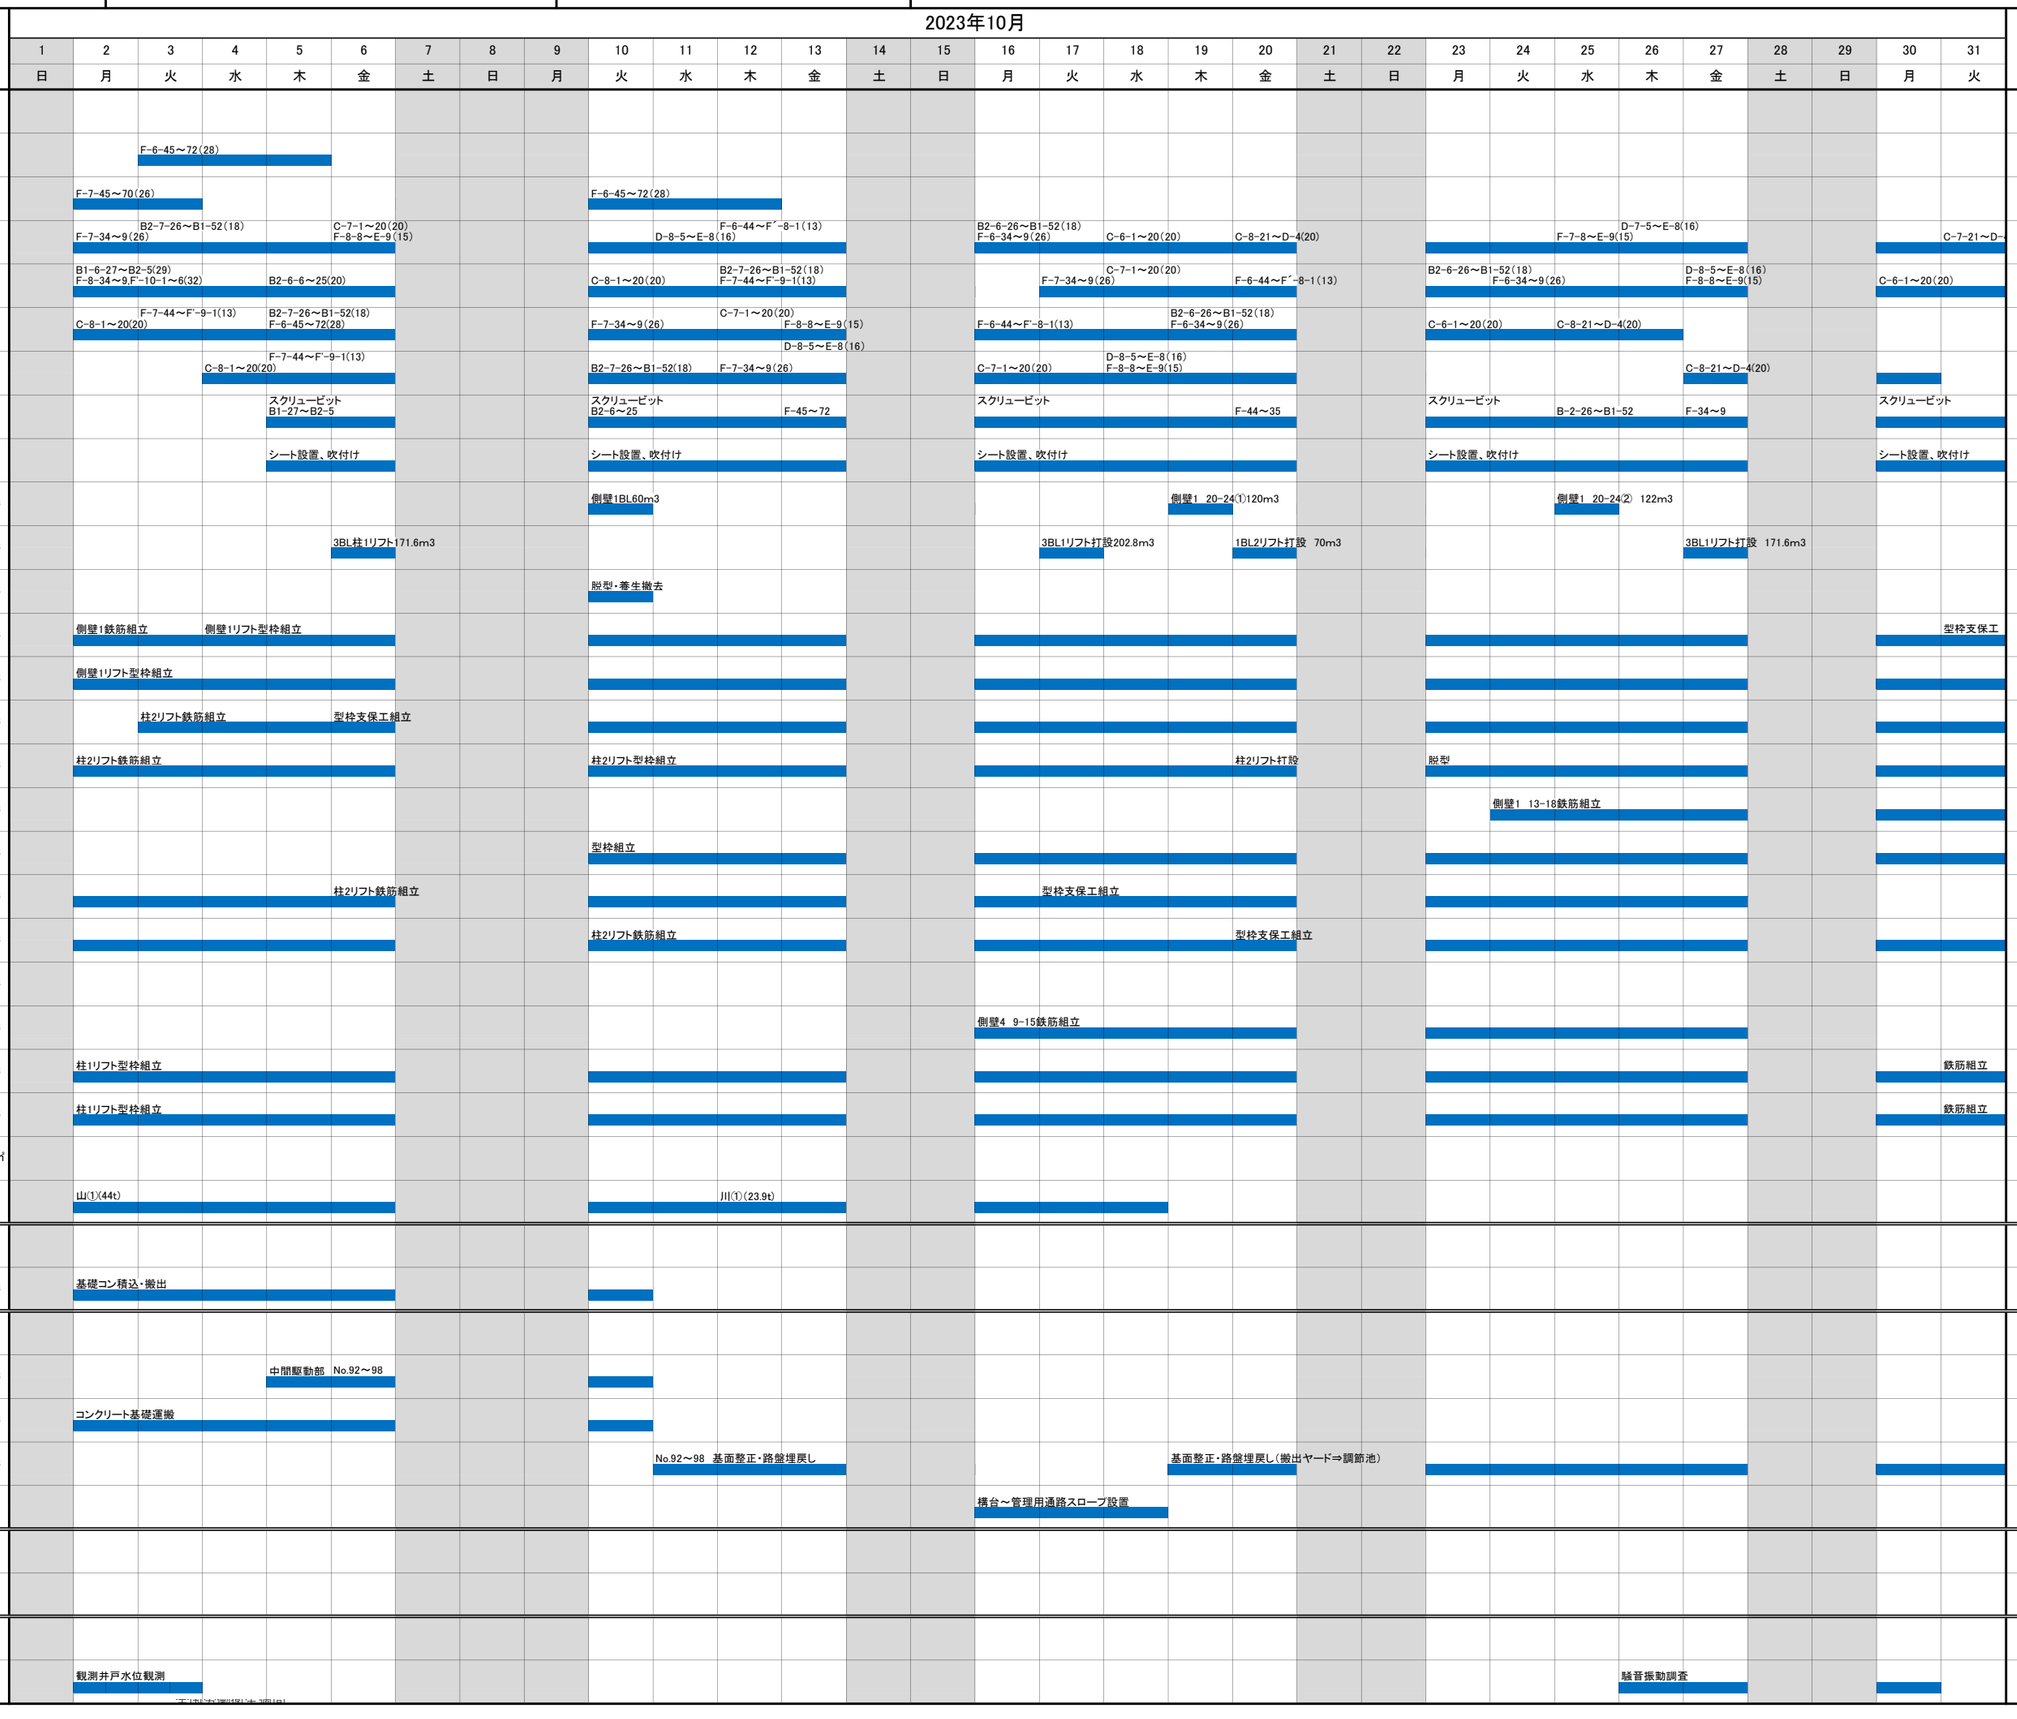
	工 種		数量	単位	備考
主要工程表	【調節池ヤード】				
	土留工(6.7.8段目)	アンカー除去(日基)	1	式	
	－〃－	アンカー除去後止水(日基)	1	式	
	－〃－	アンカー除去(日特)	1	式	
	－〃－	アンカー除去後止水(日特)	1	式	
	－〃－	腹起し撤去	1	式	
	－〃－	足場組立	1	式	
	本体構築工	縁切工	1	式	
	－〃－	縁切工	1	式	
	－〃－	側壁コンクリート打設	18405	m3	
	－〃－	柱コンクリート打設	10807	m3	
	－〃－	底版　二次貯水槽構築工	33816	m3	
	－〃－	1BL(19-24) A-F 側壁構築工	3681	m3	
	－〃－	1BL(19-24) G-L 側壁構築工	3681	m3	
	－〃－	1BL(19-24) A-F 柱構築工	2161	m3	
	－〃－	1BL(19-24) G-L 柱構築工	2161	m3	
	－〃－	2BL(14-18) A-F 側壁構築工	3681	m3	
	－〃－	2BL(14-18) G-L 側壁構築工	3681	m3	
	－〃－	2BL(14-18) A-F 柱構築工	2161	m3	
	－〃－	2BL(14-18) G-L 柱構築工	2161	m3	
	－〃－	3BL(9-13) A-F 側壁構築工	3681	m3	
	－〃－	3BL(9-13) G-L 側壁構築工	3681	m3	
	－〃－	3BL(9-13) A-F 柱構築工	2161	m3	
	－〃－	3BL(9-13) G-L 柱構築工	2161	m3	
	－〃－	足場組立(柱2リフト)	600	掛㎡	
	仮設備工	下部工撤去	1	式	
	【土砂搬出ヤード】				
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工		202	m3	
	【管理用通路】				
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工	コンクリート破砕	202	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工	コンクリート運搬	202	m3	
	舗装工	路盤埋戻し	202	m3	
	舗装工	スロープ設置	1	式	
	【長距離圧送整備】				
	整備工	配管補強	1	式	
	【その他】				
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式
